

<b>Opdrachtgever</b>	
	<b>Gemeente Jabbeke</b> Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke
<b>Ontwerper</b>	
	Gistelsteenweg Nr.112 8490 - VARSENARE (Jabbeke) Telefoon : 050/30.00.30 Telefax : 050/38.96.91 Email: <a href="mailto:info@studiebureau-lobelle.be">info@studiebureau-lobelle.be</a>
<b>Project</b>	
<b>PROVINCIE WEST VLAANDEREN</b> <b>GEMEENTE JABBEKE – AFDELING JABBEKE</b> WW 1894/1 – <b>Herinrichting Dorpsstraat te Jabbeke</b>	
Openbare procedure d.d 03 juli 2020 Aannemer: Olivier Construct Aannemingsom: 607.658,95 € (excl. B.T.W.)	Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen Beval van aanvang: Maandag 31 mei 2021

<h2 style="margin: 0;">Werfvergadering nr.30 (VERKORT)</h2> <p style="margin: 0;">Nr.30 van woensdag 23 februari 2022 te Jabbeke</p> <p style="margin: 0;"><b>DATUM OPMAAK:</b> 23 februari 2022</p>
--

	Beschrijving	Actie	
		door	
<b>1</b>	<b>Hinder voor omwonenden</b>		
	<p><b><u>De Kapellestraat:</u></b>            Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).            De straat is niet meer toegankelijk met de auto voor de bewoners van de straat. De rijweg zal gedurende de aanleg en de uitharding, afgesloten zijn tot begin april 2022. De voetpaden zijn toegankelijk voor iedereen.</p> <p><b><u>Dorpsstraat en Aartrijksesteenweg:</u></b>            Werkzaamheden Olivier Construct (= aannemer).            De Dorpsstraat is toegankelijk met de auto (plaatselijk verkeer) en dit vanaf de Aartrijksesteenweg tot aan de Kapellestraat. Het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat is afgesloten tot 14 maart 2022 en men zal dan een voorlopige toegang via rijwegplaten voorzien in de Dorpsstraat voor wisselend verkeer in de Dorpsstraat via de bestaande parking op kunststof platen. De voorlopige toegang zal men behouden tot begin april 2022.            Op 04 maart 2022 wordt het kruispunt Dorpsstraat-Bitterstraat afgesloten en is autoverkeer in de Dorpsstraat tussen 07.00 uur en 17.00 uur niet mogelijk. Op 07 maart 2022 wordt de Dorpsstraat voor 1 dag afgesloten voor de aanleg asfalt. De Dorpsstraat is op 08 maart 2022 terug open voor het wegverkeer. De voetpadzone langs de woningen is overal aangelegd en toegankelijk. De onafgewerkte boomvakken zijn afgeschermd.</p> <p>Het kruispunt Zwanestraat- Dorpsstraat blijft voorlopig afgesloten.</p>	Olivier Construct	

Tijdens aan-en afvoer van materialen met vrachtwagens, moet de aannemer 's morgens, 's middags en 's avonds rekening houden met schoolkinderen t.h.v. het kruispunt Kapellestraat-Dorpsstraat. Extra opletten is de boodschap!!!

De aannemer moeten steeds de afgeleverde signalisatiemachtiging van de gemeente opvolgen en dus de signalisatie in stand houden. Tijdens de werken moet men op vraag van bewoners er steeds voor zorgen dat ze hun woning kunnen verlaten of betreden.

Alle private aansluitingen met het openbaar voetpad zijn afgewerkt en toegankelijk voor de bewoners.

## 2 Vooruitgang van de werf

### **Kapellestraat:**

#### **Nutsmaatschappijen:**

Momenteel geen werken.

#### **Aannemer riool-en wegenis:**

Aannemer Olivier Construct:

Het voetpad is afgewerkt.

Momenteel aanleg rijweg in mozaïekkeien.



### **Kerkhof:**

#### **Aannemer riool-en wegenis:**


Aannemer Olivier Construct:

Geen werken.

### **Dorpsstraat:**

#### **Nutsmaatschappijen:**

Fluvius is momenteel het paaltje (aftakpunt elek.) aan het plaatsten t.h.v. de Zwanestraat.

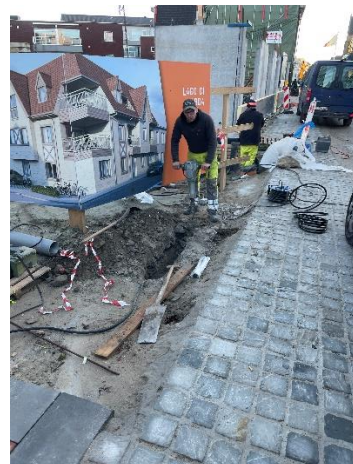

T.h.v. hsnr. 21busA, is het deksel van de trekput door Proximus op peil geplaatst.



**Aannemer riool-en wegenis:**

**Aannemer Olivier Construct:**

De blinde geleidetegels zijn geplaatst tegenaan het kruispunt Dorpsstraat-Aartrijksesteenweg-Bitterstraat.

De aansluiting privéopritten met de voetpaden is aangepast.

De plantputten voor de bomen zijn uitgegraven.

De verharding van de Zwanestraat (aansluiting) is uitgevoerd.





**Aarrijksesteenweg:**  
**Nutsmaatschappijen:**  
 Geen werken.

3

### Planning

**Kapellestraat:**  
**Nutsmaatschappijen:**  
 Fluvius:  
 Geen werken.


**Aannemer riool-en wegenis:**  
 Aannemer Olivier Construct:  
 Nog 12 werkdagen voor de aanleg bestrating in de rijweg.  
 De Kapellestraat blijft afgesloten tot begin april 2022 (uithardingsperiode).

**Kerkhof:**  
**Aannemer riool-en wegenis:**  
 Aannemer Olivier Construct:  
 Geen werken.

**Dorpsstraat:**  
**Nutsmaatschappijen:**  
 Fluvius zal vandaag aftakpunt elektriciteit t.h.v. de Zwanestraat afwerken.

**Aannemer riool-en wegenis:**  
 Aannemer Olivier Construct:  
 Vandaag de blinde geleidetegels t.h.v. het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat aan het aanleggen.  
 T.h.v. hsnr.21busA zal men de verharding afwerken rond de trekput van Proximus.  
 Vandaag en morgen de resterende verkeersborden plaatsen.  
 Op 02 maart 2022 zal men de bomen aanplanten. Hierna boomroosters voorzien.  
 Op 04 maart 2022 wordt de toplaag afgefreesd t.h.v. het kruispunt Dorpsstraat-Bitterstraat.  
 Op 07 maart 2022 wordt de Dorpsstraat afgesloten tussen de Bitterstraat en de Kapellestraat, voor de aanleg asfalt. Op 08 maart 2022 terug open voor het wegverkeer.  
 Het kruispunt Dorpsstraat-Kapellestraat is afgesloten tot 14 maart 2022 en men zal dan een voorlopige toegang via rijwegplaten voorzien in de Dorpsstraat voor wisselend verkeer in de Dorpsstraat via de bestaande parking op kunststof platen. De voorlopige toegang zal men behouden tot begin april 2022.

Olivier  
 Construct

		<p><b>Aartrijksesteenweg:</b>  <b>Nutsmaatschappijen:</b>          Geen werken.</p>		
<b>4 Algemene nota's</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle afspraken tussen de verschillende betrokken partijen, die een significante invloed hebben op de uitvoering der werken, dienen via het studiebureau te worden gemaakt. In geval van onmogelijkheid dient het studiebureau zo snel mogelijk verwittigd te worden.</li> <li>- Opmerkingen aangaande dit werfverslag dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst overgemaakt worden aan het Studiebureau Lobelle te Jabbeke (Varsenare).</li> <li>- Opmerkingen geformuleerd in de vorige werfverslagen en waaraan nog geen voldoening werd gegeven, maken deel uit van dit verslag.</li> </ul>		
<b>5 Volgende werfvergadering</b>				
		De volgende vergadering gaat door op woensdag 02 maart 2022 om 08:30 uur ter plaatse.		
<p>Opgemaakt te 8490 Jabbeke, de 23ste februari 2022          Namens de Ontwerper B.V.B.A. Studiebureau ir. CH. LOBELLE,  <b>Projectleider,</b></p>  <p>Marc Latruwe</p>				
